ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

		obra o accion		1				1	-		-
Datos de ubicación				Datos de la localidad				Cobertura de los servicios			
2. Municipio		Chilcuauti	a	6. Población total		1003		10. Agua potable		94.52%	
3. Localidad Huitexcalco (Col		olonia)	7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)		63.4		11. Alcantarillado		94.52%		
n clare de nize.		13019003	3	8. Clasificado en el Decreto ZAP (Urbano) Si / No		No		12. Tratamiento de aguas residuales			
5. Tipo de Localidad rural/urbana			Grado de marginación (CONAPO)		Вајо		13. Desinfección		94.00%		
	Inform	obra o acción				Acciones tipo del prog		jrama (Anexo IV)			
 Nombre de la obra acción 	ао	Construcción de línea de conducción a tanque, equipamiento y red eléct localidad de Col. Huitexcalco, municipio de Chilcu						16. Componente		17. Subcomponente	
		Equipamiento y tren de piezas especiales del pozo profundo; 2059.95 m de línea de conducción, con 249.50 m de tubería de Fierro Galvanizado Cédula 40 de 2 1/2 putgadas de diámetro, 405.95 m de tubería de PVC Hidráulico con						Agua Potable		Rehabilitado	
 Descripción detallada de los trabajos (En caso de PTAR y potabilizadoras, 								18. Acción	19. Subacción	20. Unidad de medida	21. Meta
describir el tipo de proceso, caudal tratado y		Campana RD-26 de 2 1	/2 pulgadas de d	liámetro, y 1,404.49 n	2 1/2 puigadas de diametro, 4u5.96 m de tubería de PVC Hidraulico con netro, y 1,404.49 m de tubería de PVC Abocinado de 2 1/2 pulgadas de diámetro; caseta de controles.			7. Equipamiento	Electromecánico	Pieza	1
normatividad a cum								3. Línea de conducción	Línea de bombeo	км	2.05995
Número del título de concesión/asignación o p			permiso de Acuse de trámite con número de			e expediente HGO-L-02	266-18-09-19				
descarga Datos del proyecto				Datos de validación				Habitantes a beneficiar			
22. Fecha de proyecto		26/02/2021		27. No. de oficio validación Conagua		BOO.912.0300166		32. Incorporados		33. Mejorados	
23. Fecha de proyecto actualizado		feb-23		28. Fecha validación Conagua		26/02/2021				1003	
24. Periodo de ejecución		Julio - Diciembre 2023		29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base		Catálogo de precios de Gobierno del Estado		Tipo de población a beneficiar			
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)		20.265232°; -99.281337°		30. Instancia ejecutora		CEAA		34. Mujeres		517	
26. Inversión total		\$ 3,000,000.00		31. Organismo operador		Municipio		35. Población indígena		753	
Fuente de financiamiento								36. Población afro mexicana		3	
40. Inversión federal		41. Inversión estatal		42. Inversión municipal		43. Inversión organismo operador		Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora	
Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	37. Incorporados	38. Mejorados	39. a ⁻	Tratar
\$ 1,050,000.00	35%	\$ 1,050,000.00	35%	\$ 900,000.00	30%	\$ -	0%				
		Obra en	etapas (Re	elacionar cada	una de las	etapas , incluye	endo la del _l	presente ejerci	cio)		
44. Nombre y etapa de la obra		45. Descripción de los trabajos						46. Inversión total	47. Inversión federal	48. Porcentaje federal	49. Año de ejecución
Construcción de línea de conducción a tanque, equipamiento y red eléctrica para pozo de agua potable, en la localidad de Col. Huitexcalco, municipio de Chilcuautla, Hidalgo.		Equipamiento y tren de piezas especiales del pozo profundo; 2059.95 m de línea de conducción, con 249.50 m de tuberia de Fierro Galvanizado Cédula 40 de 2 1/2 pulgadas de diámetro, 405.96 m de tubería de PVC Hidráulico con Campana RD-26 de 2 1/2 pulgadas de diámetro, y 1,404.49 m de tubería de PVC Abocinado de 2 1/2 pulgadas de diámetro; caseta de controles.						\$ 3,000,000.00	\$ 1,050,000.00	35%	2023
			50. Suma					\$ 3,000,000.00	\$ 1,050,000.00	35%	
51. Fecha de Elaboración		feb-23					- 5,500,000.00	,000,000.00	3576		
J1. Fecha de Elaboraciofi			1eb-23								

Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Alfredo Hernández Parra Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Dirección local Hidalgo de la CONAGUA


2

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

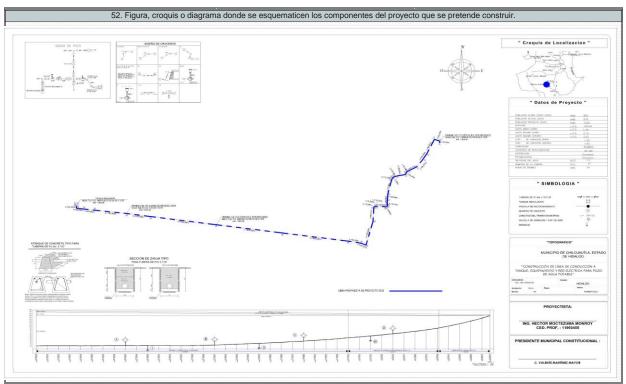

Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Alfredo Hernández Parra Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Dirección local Hidalgo de la CONAGUA

2
